

2024년 군 발주사업 행정사무조사 처리결과

2024년 군 발주사업 행정사무조사 처리결과 목록

연번	실 단 과 소	사 업 명
1	농 업 정 책 과	▪ 고흥군 신활력플러스사업(농산물스마트공급센터) 3
2	농 업 정 책 과	▪ 고흥군 로컬푸드 직매장 사업 3
3	건 설 과	▪ 대서 신촌마을 안길 확포장 공사 3
4	건 설 과	▪ 과역 참살이 맨발로 조성사업 4
5	건 설 과	▪ 남양 와야마을 석축 및 배수로 정비공사 4
6	건 설 과	▪ 2024 점암 한동마을 배수로 정비공사 4
7	재 난 안 전 과	▪ 점암 구천 소하천 정비공사 5
8	산 림 정 원 과	▪ 팔영산 자연휴양림 보완사업 건축 5
9	산 림 정 원 과	▪ 2024년 팔영산 편백 치유의 숲 맨발숲길 조성 5
10	건 설 과	▪ 영남 모사금 방면 도로 보수공사 6
11	주 민 복 지 과	▪ 고흥군립하늘공원 조성사업 6
12	건 설 과	▪ 고흥군 도시재생 뉴딜 수제맥주 브루어리 조성사업 건축공사 6
13	재 난 안 전 과	▪ 두원 동촌교 연결도로 정비사업 7
14	해 양 개 발 과	▪ 봉래 염포항 지방어항 정비사업 7
15	재 난 안 전 과	▪ 동일면 양화간척지 농로 포장 7
16	건 설 과	▪ 동일 추억으로 맨발길 조성사업 8
17	산 림 정 원 과	▪ 2024 해안방재림 조성사업(동일덕흥지구) 8
18	산 림 정 원 과	▪ 포두 해창만 갈대숲 데크 산책로 조성사업 8
19	산 림 정 원 과	▪ 2024년 고흥군 유아숲체험원 조성 9
20	산 림 정 원 과	▪ 2024년 도덕 힐링 오솔길 조성사업 9
21	스마트팜사업소	▪ 스마트팜 혁신밸리 기존농업인용 임대형 스마트팜 조성 9
22	스마트팜사업소	▪ 스마트팜 혁신밸리 저수조 준설공사 10
23	스마트팜사업소	▪ 스마트팜 혁신밸리 농기계 보관창고 설치 10
24	스마트팜사업소	▪ 스마트팜 혁신밸리 가압장 설치공사 10
25	재 무 과	▪ 풍양면사무소 청사 신축 건축공사 11
26	산 림 정 원 과	▪ 2024년 학교숲(금산중학교) 조성사업 11
27	관 광 정 책 실	▪ 거금대교(북측) 탐방로 정비공사(2차분) 11

2024년 군 발주사업 행정사무조사 처리 현황

실과소	조사 사업수	지적 사업수	처리결과		비고
			완결	추진중	
총계	81	27	9	18	
종합민원실	3	-	-	-	
관광정책실	6	1	-	1	
주민복지과	1	1	1	-	
재무과	1	1	-	1	
문화체육과	1	-	-	-	
경제산업과	1	-	-	-	
농업정책과	4	2	2	-	
수산정책과	1	-	-	-	
해양개발과	2	1	-	1	
산림정원과	8	7	1	6	
재난안전과	9	3	2	1	
건설과	25	7	1	6	
농업기술센터	7	-	-	-	
상하수도사업소	2	-	-	-	
분청문화박물관	1	-	-	-	
스마트팜사업소	9	4	2	2	

2024년도 군 발주사업 행정사무조사 지적사항 처리결과

연번	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	처 리 결 과	비고
1	고흥군 신활력플러스사업 (농산물스마트 공급센터)	- 위 치: 동강면 한천리 71-8 - 사업량: 지상 2층 철골조 (조립식) - 대지면적 5,265㎡(1,592평) - 건축연면적 2,067㎡ (1층 1,261㎡, 2층 806㎡) - 1층 농산물 공급센터 - 2층 운영사무실, 미디어실, 교육회의실, 창업공유오피스 - 사업비: 6,300,000천원 - 도금액: 6,300,000천원 - 관금액: - - 사업기간 - 착공일: '24. 10. 07. - 준공일: '25. 12. 20.	(개선사항) - 현재 공정률에 비해 사업 계약기간이 촉박한 상황으로 2025년 내 사업 마무리 우려 - 센터 준공 후 생산자 중심의 운영 체계 구체적 계획 방안 미흡 (시정사항) - 공사장 주변 통행인의 안전 확보를 위해 안전시설물 보완이 요구됨	(개선사항) 11. 7. 현재 공정을 80%로 연내 사업완료 철저 증빙 15p - 생산자 중심 운영체계 관련 사업설명회 개최(11. 6. / 12.) 증빙 16p (시정사항) - 공사장 주변 안전관리 철저 (증빙자료 참고) 증빙 16p	농업정책과 (완 료)
2	고흥군 로컬푸드 직매장 사업	- 위 치: 동강면 고흥로 4797 - 사업량: 지상 1층 철골조 (조립식) - 건축연면적 100㎡(33평) - 사무실, 계산대, 판매대, 냉장쇼케이스 - 사업비: 1,000,000천원 - 국 비: 300,000천원 - 도 비: 90,000천원 - 군 비: 610,000천원 - 사업기간: '24. 01. ~'25. 12.	(개선사항) - 고령생산농가를 위해 당초 계획대로 순회수집 서비스를 철저히 운영할 필요성이 있음 - 지역 농가의 안정적 판로 확보가 중요하다고 판단됨 - 사업 시행으로 인한 주차 공간부족 문제에 따른 방문객 불편 예상	(개선사항) - 순회수집서비스를 위한 냉동탑차 구입(12월 중) 증빙 17p - 안정적 판로 확보를 위한 농가 교육 및 설명회 지속 추진 증빙 18p - 방문객 불편 최소화 교통체계개선	농업정책과 (완 료)
3	신촌마을 안길 확포장 공사 (2회추경)	- 위 치: 대서면 송강리 1240 - 사업량: 배수관(D500) L=30m, 개거(0.5×0.5) L=6m, 전석쌓기(H=1.1~2.1m) L=28m - 사업비: 25,021천원 - 도금액: 22,151천원 - 관금액: 2,870천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 11. 25. - 준공일: '25. 01. 23.	(시정사항) - 일부 구간의 석축이 낮아 침수 및 토사 유실 우려가 있으므로 사전 보완 조치 필요 - 전석 쌓기 시공 구간 잔돌 채우기 마감 불량으로 구조 안정성 우려	(시정사항) - 토지소유자와 협의 중 협의 완료 후 추진 예정 - 고임돌 재시공 완료 증빙 19p	건 설 과 (추 진 중)

2024년도 군 발주사업 행정사무조사 지적사항 처리결과

연번	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	처 리 결 과	비고
4	참살이 맨발로 조성사업	- 위 치: 과역면 과역리 409-5 - 사업량: 마사토포장(B=1.2m) L=134.0m, 세죽장 및 신발장 설치 1식 - 사업비: 38,820천원 - 도급액: 36,247천원 - 관급액: 2,573천원 - 사업기간 - 착공일 : '24. 03. 22. - 준공일 : '24. 07. 02.	(시정사항) - 맨반길 유지 관리 미흡으로 자갈, 잡초 등이 산재되어 있어 주민 이용 불편 초래 - 세죽장이 목재로 조성되어 있어 장기적 시설 유지 관리에 어려움이 예상됨	(시정사항) 11월 중 조치 완료 예정 - 세죽장 보수 완료 증빙 p20	건 설 과 (추진 중)
5	와이마을 석축 및 배수로 정비공사	- 위 치: 남양면 망주리 1280-1 - 사업량 - 석축(H=1.5m) L=40m - 벤치플룸관(400C) L=6.0m - 사업비: 21,322천원 - 도급액: 15,562천원 - 관급액: 5,760천원 - 사업기간 - 착공일 : '24. 08. 27. - 준공일 : '24. 10. 25.	(시정사항) 천단부와 도로부 접합 시공면이 불량하여 차량 통행성 및 안전성 저해 우려	(시정사항) 11월 중 조치 완료 예정	건 설 과 (추진 중)
6	2024 점암 한동마을 배수로 정비공사(2화추경)	- 위 치: 점암면 강산리 산167-4 - 사업량 - L형 옹벽측구 (H=0.85m, L=45m) - 플룸관(0.5*0.5m, L=14m) - 콘크리트포장(B=3m, L=35m) - 사업비: 16,662천원 - 도급액: 12,612천원 - 관급액: 4,050천원 - 사업기간 - 착공일 : '24. 11. 29. - 준공일 : '24. 12. 20.	(개선사항) 배수로 시공 설계 현장 실측 부족 등으로 호우 시 우수가 원활히 배제되지 않아 아스콘 포장 들뜸 현상 수시 발생 등 공사 시공 상태 미흡	(개선사항) 2026년 본예산 반영	건 설 과 (추진 중)

2024년도 군 발주사업 행정사무조사 지적사항 처리결과

연번	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	처 리 결 과	비고
7	점암 구천 소하천 정비공사	- 위 치: 점암면 천학리 일원 - 사업량: 흙깎기 9,160㎡, 흙쌓기 10,741㎡, 터파기 3,158㎡, 도메우기 361㎡, 환경옹벽블록 1,818㎡, 환경블록 4,782㎡, 전석쌓기 1,560㎡, 배수통관 25m, 개거 720m, RC BOX교 4개소, 낙차공 1개소 - 사업비: 2,619,270천원 - 도급액: 1,699,960천원 - 관급액: 919,310천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 01. 26. - 준공일: '26. 04. 01.(예정)	(개선사항) 공사 구간 내 노후 교량인 구천1교는 대형차량과 농기계 통행 진입 시 안전사고 발생 위험이 높아 구조적 안정성 확보를 위한 정밀안전진단이 절실히 필요한 실정임	(개선사항) 정밀안전 진단시행 이후 결과에 따라 보수보강 또는 재가설 추진	재난안전과 (추진 중)
8	팔영산 자연휴양림 보완사업 건축	- 위 치: 영남면 우천리 산 350-1 - 사업량: 휴양관 및 산막동 보수, 세탁실 조성 등 - 사업비: 500,714천원 - 도급액: 404,998천원 - 관급액: 95,716천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 04. 03. - 준공일: '24. 07. 20.	(개선사항) 입구 구간의 경사가 급하고 노면이 미끄러워, 이용객의 보행 안전사고 발생 우려가 있음. 또한, 진입로 폭이 협소하여 시설 이용시 불편 야기 우려	(개선사항) 진입로 보강사업비 2026년 추경 예산 요구 예정	산림정원과 (추진 중)
9	2024년 팔영산 편백 치유의 숲 맨발숲길 조성	- 위 치: 영남면 금사리 산 67-62 - 사업량: 맨발숲길 조성 1식 - 사업비: 84,447천원 - 도급액: 84,447천원 - 관급액: - - 사업기간 - 착공일: '24. 02. 28. - 준공일: '24. 05. 06.	(개선사항) - 세족장 설치대가 제한적이어서 주말 등 이용객이 집중되는 시간대에는 다수의 이용객이 대기하는 등 불편 야기 - 맨발숲길의 길이가 다소 짧아, 이용객들이 동일 구간을 반복하여 걷는 등의 현상 발생	(개선사항) - 세족장 추가 설치 사업비 2026년 추경 예산으로 요구 예정 - 방문객들의 맨발숲길 이용 실태 조사 후 보완 사업 등 검토	산림정원과 (추진 중)

2024년도 군 발주사업 행정사무조사 지적사항 처리결과

연번	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	처 리 결 과	비고
10	영남 모시금 방면 도로 보수공사	- 위 치: 영남면 금사리 202-2 - 사업량 - 플룸관(600C, L=192m) - 콘크리트포장복구 (B=5m, L=50m) - 사업비: 37,000천원 - 도금액: 21,000천원 - 관금액: 16,000천원 - 사업기간 - 착공일 : '24. 09. 13. - 준공일 : '24. 11. 11.	(개선사항) ◦ 시공 배수로 경계부 잔여구간 미포장 상태 등 공사 마무리 미흡	(개선사항) ◦ 향후 도로 포장 설계 시 노면부 포장 반영하여 시공 예정	건 설 과 (추진 중)
11	고흥군립하늘공원 조성사업	- 위 치: 고흥읍 호형리 산 169 - 사업량 - 봉안당(연면적 2,943㎡) - 자연장지(3,477㎡), - 주차장(버스5, 일반115) - 유택동산 등 - 사업비: 19,700,000천원 - 국 비: 3,900,000천원 - 도 비: 1,400,000천원 - 군 비: 14,400,000천원 - 사업기간: '21~'25	(개선사항) ◦ 사업추진 과정에서 주요 변경사항이 발행하였음에도 의회 사전보고 미이행	(개선사항) ◦ 향후 사업추진 시 변경사항 등 사업계획이 조정 될 시 의회에 사전 보고토록 하겠음	주민복지과 (완 료)
12	고흥군 도시재생 뉴딜 수제맥주 브루어리 조성사업 건축공사	- 위 치: 고흥읍 남계리 605 - 사업량: 신축 1동(지상2층, 연면적 741.03㎡, 철근콘크리트조) - 사업비: 4,060,000천원 - 국 비 : 2,310,000천원 - 군 비 : 250,000천원 - 자 체 : 1,500,000천원 - 사업기간 - 착공일 : '24. 09. 03. - 준공일 : '25. 09. 02.	(개선사항) ◦ 공사 진행 과정에서 일부 마감재 변경 등이 있으나, 변경내역이 명확히 정리되지 않아 공사관리의 투명성 미흡	(개선사항) ◦ 수제맥주브루어리 조성 건축공사 도급비 내 계약 물량을 면밀히 검토하여 정산 준공 완료하였음	건 설 과 (완 료)

2024년도 군 발주사업 행정사무조사 지적사항 처리결과

연번	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	처 리 결 과	비고
13	두원 동촌교 연결도로 정비사업	- 위 치: 두원면 용반리 1682-1 - 사업량: 교량(두원교) 연결도로 (L=233m B=8.1m) 1개소 - 사업비: 1,295,245천원 - 도금액: 1,266,636천원 - 관급액: 28,609천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 09. 20. - 준공일: '25. 10. 30.(예정)	(시정사항) ◦ 교량 구간에 경광등이 미설치되어 야간에는 시인성 저하로 인한 안전사고 위험 우려 ◦ 교량 입구 내리막길 구간에 반사경이 미설치되어 차량 통행 시 시야 확보에 어려움이 있음	(시정사항) ◦ 두원 동촌교 안전시설물 설치 완료('25.11.10.) ◦ 사업량: 교량 경고등 6Ea 반사경 1Ea 증빙 21p	재난안전과 (완 료)
14	봉래 염포항 지방어항 정비사업	- 위 치: 봉래면 외초리 216 - 사업량 - 서방파제 선착장증설 (L=39m) - 동방파제 증설(L=63m) - 사업비: 952,000천원 - 도금액: 733,000천원 - 관급액: 219,000천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 10. 29. - 준공일: '25. 03. 10.	(시정사항) ◦ 선착장 정비 실시로 보안등이 중앙에 위치하게 되어 주민이용 불편 초래	(시정사항) ◦ '25. 12.한 보안등 이설 조치 예정	해양개발과 (추 진 중)
15	동일면 양화간척지 농로 포장	- 위 치: 동일면 백양리 723-4 - 사업량 - 전석쌓기 (H=2.3m, L=66m) - 콘크리트 포장 (B=1.2m, L=66m) - 사업비: 41,000천원 - 도금액: 36,000천원 - 관급액: 5,000천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 03. 11. - 준공일: -	(개선사항) ◦ 전석 쌓기 이후 콘크리트 포장 폭이 늘어남에 따라 전주가 가운데에 위치하게 되어 통행에 불편 초래	(개선사항) ◦ 하천 제방 공사를 시공하면서 도로 폭이 기존 3m에서 4m로 확장됨 한전주 이설을 하지 않아도 차량 통행하는데 불편 사항이 없음	재난안전과 (완 료)

2024년도 군 발주사업 행정사무조사 지적사항 처리결과

연번	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	처 리 결 과	비고
16	추억으로 맨발길 조성사업	- 위 치: 동일면 백양리 795 - 사업량: 포장공 L=97m - 사업비: 42,000천원 - 도급액: 40,000천원 - 관급액: 2,000천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 03. 18. - 준공일: '24. 06. 27.	(시정사항) ◦ 맨발길에 에어건 설치 부적정	(시정사항) ◦ 세족상 설치 관련 교육청·학교 등과 협의 중, 협의 완료 후 설치 예정	건 설 과 (추진 중)
17	2024 해안방재림 조성사업 (동일덕흥지구)	- 위 치: 동일면 덕흥리 산207-8 - 사업량 - 동백나무 88주 - 마운딩 175.05㎡ - 사업비: 83,000천원 - 도급액: 83,000천원 - 관급액: - - 사업기간 - 착공일: '24. 05. 16. - 준공일: '24. 07. 26.	(시정사항) ◦ 방재림 부지 내 개인이 해수욕장 및 샤워실 입장료 간판 설치하여 관광활성화 저해	(시정사항) ◦ 덕흥마을회·해수욕장 관리자와 협의 중, 해당 사항은 해수욕장 소관부서인 관광정책실에서 처리 및 별도 보고 예정	산림정원과 (추진 중)
18	해창만 갈대숲 데크 산책로 조성사업	- 위 치: 포두면 송산리 1641 - 사업량: 데크산책로 1식 - 사업비: 1,650,000천원 - 도급액: 750,000천원 - 관급액: 900,000천원 - 사업기간 - 착공일: '23. 06. 30. - 준공일: '24. 08. 30.	(시정사항) ◦ 산책로 지지대(강관) 녹 발생 - 하자보수 시행하고 사진 제출 ◦ 산책로입구 데크기둥 베이스캡 미고정 및 바닥재 파손 - 기둥 베이스캡 고정 및 바닥재 보수	(시정사항) ◦ 해당 도로는 세라믹 도로로 하자에 의해 녹이 발생하지 않는 페인트로 확인 현장에서 확인된 녹은 용접 작업 중 생긴 파편으로 관광정책실에서 보수 예정 ◦ 베이스캡은 원래 미고정되는 시공법이고, 파손된 바닥재는 보수 시행 완료	산림정원과 (추진 중)

증빙 22p

2024년도 군 발주사업 행정사무조사 지적사항 처리결과

연번	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	처 리 결 과	비고
19	2024년 고흥군 유아숲체험원 조성	- 위 치: 포두면 옥강리 1066-14 - 사업량: 유아숲체험원 조성 1식 - 사업비: 176,000천원 - 도금액: 68,000천원 - 관금액: 108,000천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 05. 02. - 준공일: '24. 06. 20.	(개선사항) 목재 체험장 내 화장실까지 거리가 멀어 화장실 이용 어려움	(개선사항) 유아들의 화장실 이용 실태 조사 후 보완사업 등 검토 예정	신림정원과 (추진 중)
20	2024년 도덕 힐링 오솔길 조성사업	- 위 치: 도덕면 도덕리 29-6 - 사업량 - 숲길 개설 550m, - 초화류 식재 - 편의시설 설치 등 - 사업비: 46,000천원 - 도금액: 16,000천원 - 관금액: 30,000천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 05. 17. - 준공일: '24. 07. 05.	(시정사항) 안내 표지판이 관광객이 보기 어려운 방향으로 설치되어 있는 등 군민홍보 부족	(시정사항) 기존 설치된 표지판을 이용자 동선·진입로 중심부 등 보다 노출도가 높은 위치로 재설치 완료, 현수막 설치 및 SNS 활용 홍보 예정 증빙 23p	신림정원과 (완 료)
21	스마트팜 혁신밸리 기존농업인용 임대형 스마트팜 조성	- 위 치: 도덕면 가야리 3742-3 일원 - 사업량: 3.6ha - 사업비: 16,000,000천원 - 도금액: 9,267,000천원 - 관금액: 6,733,000천원 - 사업기간 - 착공일: '23. 09. 01. - 준공일: '25. 08. 30.	(시정사항) 스마트팜 온실 내 바닥 콘크리트 크랙 발생, 상부 누수, 레일 시공상대 불량, 개폐기 작동고장	(시정사항) - 하차보수 추진 중 - 바닥 크랙 전구역, 추진 중 (완료 2, 예정 8) ※ 통행 지장 보수는 농가 협의 후 작물 휴작기에 조치 예정('26. 7월) - 누수(2구역): 완료 - 레일(전구역): 완료 - 개폐기(1구역): 완료 증빙 24~28p	스마트팜 사업소 (추진 중)

2024년도 군 발주사업 행정사무조사 지적사항 처리결과

연번	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	처 리 결 과	비고
22	스마트팜 혁신밸리 저수조 준설공사	- 위 치: 도덕면 가아리 3742-3 일원 - 사업량: 3개소 - 사업비: 43,000천원 - 도급액: 43,000천원 - 관급액: - - 사업기간 - 착공일: '24. 05. 16. - 준공일: '24. 07. 17.	(시정사항) - 준설 공사비와 청소 용역비 간 사업비 차액이 발생되어 과다 집행 - 저수조 방수시트 들뜸현상 발생	(시정사항) - 정산차액 환수 조치 완료(905,250원) 증빙 29p - 작물 휴작기에 조치 예정 ('26. 7월)	스마트팜 사 업 소 (완 료) (추진 중)
23	스마트팜 혁신밸리 농기계 보관창고 설치	- 위 치: 도덕면 가아리 3742-3 일원 - 사업량: 일반철골구조 1동 - 사업비: 225,000천원 - 도급액: 142,000천원 - 관급액: 83,000천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 06. 20. - 준공일: '24. 09. 10.	(시정사항) 바닥 마감재 시공 상태 불량	(시정사항) 바닥 배수로 인근 마감재 보완 조치 완료 증빙 30p	스마트팜 사 업 소 (완 료)
24	스마트팜 혁신밸리 가압장 설치공사	- 위 치: 도덕면 가아리 3742-3 일원 - 사업량: 1식 - 사업비: 169,000천원 - 도급액: 112,000천원 - 관급액: 57,000천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 11. 22. - 준공일: '25. 06. 26.	(시정사항) 바닥 콘크리트 시공 상태 불량 기계 운영에 지장 초래 우려	(시정사항) 바닥 마감 시공 완료 증빙 31p	스마트팜 사 업 소 (완 료)

2024년도 군 발주사업 행정사무조사 지적사항 처리결과

연번	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	처 리 결 과	비고
25	풍양면사무소 청사 신축 건축공사	- 위 치: 풍양면 아막리 515-4 - 사업량: 신축 1동 (A=1,305㎡) - 사업비: 2,308,000천원 (계속사업) - 24년 사업비: 587,000천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 11. 13. - 준공일: '25. 11. 12.	(시정사항) ◦ 청사 조경수 수종 선적 부적절, 소나무 등 수종 재선정해서 시공 필요	(시정사항) ◦ 추진위원 의견 및 설계자 의도 반영하여 신청사 품격에 맞는 조경계획 후 식재 예정 증빙 32p	재 무 과 (추진 중)
26	2024년 학교숲 (금산중학교) 조성사업	- 위 치: 금산면 대흥리 320 - 사업량 - 교목류 53주 - 관목류 1,258주 - 산책로 조성 - 사업비: 73,000천원 - 도금액: 73,000천원 - 관금액: - - 사업기간 - 착공일: '24. 04. 18. - 준공일: '24. 06. 07.	(시정사항) ◦ 바닥 현무암 판석의 시공 물량이 1㎡당 70% 시공되어야 하나, 시공물량 부족	(시정사항) ◦ 재시공 완료 증빙 33p	산림정원과 (완 료)
27	거금대교 (복층) 탐방로 정비공사 (2차분)	- 위 치: 금산면 신촌리 316-1 - 사업량 - 자전거보행자도로 포장 - 주차장 포장 - 벽화 조성 - 사업비: 735,000천원 (계속사업) - 24년 사업비: 18,000천원 - 사업기간 - 착공일: '24. 03. 20. - 준공일: '24. 11. 30.	(시정사항) ◦ 거금대교 탐방로 내 화장실 미설치로 관광객 불편	(시정사항) ◦ 거금대교 자전거도로 종점에서 70m 거리에 화장실이 설치되어 있고, 거금대교 내에는 안전, 오수처리 등의 문제로 설치는 어려움. 이용객이 불편하지 않도록 화장실 위치와 남은 거리를 표기한 안내판 제작·설치 예정	관광정책실 (추진 중)

행정사무조사
조치결과
증빙자료

□ 공사 추진 현황

- 2025. 11. 7. 기준 공정을 80%로 연내 사업 완료 철저

□ 운영방안

- 농산물 공동선별장(APC) 공동물류 시스템 구축
- 운영 체계: 고흥군 직접운영
 - 고흥군 농산물 스마트 공급센터 운영에 관한 조례 제정('25.11월)
- 조직구성 및 업무

구분		직원수	주요 업무
계		5	
고흥군농산물 스마트공급센터	팀장	1	시설팀장 신설
	임기제공무원	1	센터 운영 전문가, 판로처 개척
	공무직	1	정산 회계실무
	기간제	2	현장업무(지게차, 상하차)

- 취급품목
 - 토마토(방울, 완숙): 30.8ha 1,956톤 - 복숭아: 42.3ha 1,037톤
- 핵심기능
 - 집하, 원물관리, 선별, 포장, 저장, 보관, 물류
 - 당일선별 당일처리, 선별사 10명내외로 구성(일용 인부)
 - 농산물별, 작목회별 공동계산제(운송, 포장, 수수료)
 - 거래처: 대형유통업체(이마트, 홈플러스, 백화점 등), 각종 도매시장
 - 복숭아(완숙토마토) 선별기: 프리트레이 방식, 시간당 최대 9톤 처리
 - 방울토마토 선별기: 벨트 방식, 시간당 최대 10톤 처리
- 출하 농산물 가격 및 수수료 결정
 - 시장가격 조사로 권장가격 제시
 - 군 직영으로 농가(생산자) 소득 보전을 위해 최소한의 수수료 책정

□ 2026년 본격 운영에 따른 목표 매출액 및 소요예산(안)

- 2026년 목표 매출액: 50억원
 - 연중 가동율 80% 이상, 안정적 출하 관리
 - 2026년 소요예산액: 3억원(군비)
 - 선별사 인건비 100백만원, 공선출하 보전금 50백만원, 군수 인증 포장재 구입 40백만원, 농산물 안전성 검사 40백만원
 - 센터운영 사무공공운영비 50백만원, 출하농가 교육비 20백만원
- ⇒ 공선출하 보전금 등 2026년 국비사업 신청

□ 이후계획

- 출하농가 설명회 및 교육: 2025. 8. ~ 11. (2026년 연중 실시)
- 사업준공 만전: 2025. 12.(예정)

증빙자료

1. 고흥군 신활력플러스사업(농산물스마트 공급센터)

□ 생산자 중심의 운영체제 사업설명회

활한 도마, 활활한 고흥!

고 흥 군

수신 수신자 참조
(경유)

제목 고흥군 농산물 스마트 공급센터 등 추진 사업 설명회 참석 및 협조 요청

1. 우리군에서는 고흥군 농산물 스마트 공급센터 건립사업, 고흥군 로컬푸드 직매장 설치사업, 고흥군 직영 온라인 쇼핑몰 고흥물 문영 등 농산물 유통 판매 사업을 추진 중에 있습니다.

2. 판매생산능력을 대상으로 추진사업설명회를 개최코자 하오니 대서원예작목회(대표 송학은), 동강대서원예작목회(대표 이영재) 등 회원이 참석할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 고흥군 농산물 스마트 공급센터 등 추진 사업 설명회
가. 일시장소참석

일시	장소	참석
11.6.(목) 14:00	대서원사무소 2층 회의실	대서원예작목회(대표 송학은) 20명, 양주도마도
11.12.(수) 14:00	동강원사무소 2층 회의실	동강원예작목회(대표 이영재) 20명, 양주도마도

나. 내용: 고흥군 농산물 스마트 공급센터 사업, 고흥군 로컬푸드 직매장 사업, 고흥군 직영 온라인 쇼핑몰 고흥물 문영 추진 사업설명

다. 설명: 농업정책과 스마트유통팀(팀장 이경식, 주무관 이정인)
고흥군 농촌 신활력플러스사업단(사무국장 박진혁)

라. 협조사항: 해당원사무소 회의실 대관

붙임 사업설명회 자료 1부. 끝.

고 흥 군

수신자: 동강원장, 대서원장, 대서원예작목회 대표 송학은, 동강원예작목회 대표 이영재

스마트유통팀장 이영재 (보통영역 4인) (2025. 11. 3.)

참조자: 합수

시책: 농산물유통 (33336) (2025. 11. 3.)

주: 516-42 전자상거래 고흥군 고흥물 고흥물문영 1

전화번호: 061-833-5791 팩스번호: 061-833-5204 E-mail: gahong@korea.kr / http://www.gohung.go.kr

참자: 양주도마도

참자: 양주도마도

□ 공사장 주변 안전관리 철저

- 2025. 11.7. 현재 공사장 주변 안전관리 철저



□ 공사 추진 현황

- 2025. 11. 7. 현재 공정율 70%로 연내 사업 완료 철저

□ 운영방안

- 운영 체계: 고흥군 직접 운영
 - 고흥군 로컬푸드 육성 및 직매장 운영에 관한 조례 제정('25.11.)
- 조직구성 및 업무

구분		직원수	주요 업무
계		5명	
고흥군 로컬푸드 직매장	팀장	1	고흥물운영팀장 통합관리
	임기제공무원	1	직매장 총괄 (매장관리, 기획생산)
	공무직	1	매장관리, 정산
	기간제	2	매장관리, 상품진열

- 출하 농가 및 품목 관리
 - 연중 300농가, 500개 품목 이상, 주요 150개 품목 안정적 출하 관리
 - ⇒ 출하 농가 로컬푸드 교육, 농산물 안전성 검사
- 출하 농산물 가격 및 수수료 결정
 - 참여농가(생산자) 직접 결정, 정기 시장가격 조사로 권장가격 제시
 - 군 직영으로 농가(생산자) 소득 보전을 위해 **최소한의 수수료 책정**
- 직매장 위치, 영세농, 고령농 등의 농산물 순회수집 차량 운영
 - 직매장이 동강면에 위치하여 거리에 따른 냉장 탑차 농산물 순회 수집 운영

□ 2026년 본격 운영에 따른 목표 매출액 및 소요예산(안)

- 2026년 목표 매출액: 10억원
 - 연중 300농가, 500개 품목 이상, 주요 150개 품목 안정적 출하 관리
- 2026년 소요 예산액: 2억원(군비)
 - 직매장 운영 사무관리비 27백만원, 로컬푸드 인증 포장재 구입 45백만원
농수축산물 안전성 검사 46백만원
 - 공공운영비 23백만원, 출하농가 로컬푸드 출하농가 교육비 22백만원
 - ⇒ 로컬푸드 안전성 검사, 출하 농가 교육비 등 2026년 국비 사업 신청

□ 이후계획

- 출하농가 모집 설명회 및 교육: 2025. 8. ~ 11. (2026년 연중 실시)
- 로컬푸드직매장 사업준공 만전: 2025. 12.(예정)

증빙자료

2. 고흥군 로컬푸드 직매장 사업

□ 공사 추진 현황




수선 내부결재
 (경유)
 제목: 고흥군 로컬푸드직매장 출하농가 세부설명회 계획
 고흥군 로컬푸드직매장 건립에 따른 출하농가 조직화를 위해 세부설명회를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

□ 개요
 가. 일시: 2505. 11. 29. (금) 14:00 ~ 16:00
 나. 장소: 고흥문화회관 승선실(2층)
 다. 참석: 고흥군 로컬푸드 직매장 출하농가 100여명, * 참여희망농가: 281명
 라. 내용: 고흥군 로컬푸드 직매장 출하농가 세부 설명회
 마. 추진: 고흥군 농촌 신활력플러스사업단 운영 추진

불임 1. 고흥군 로컬푸드 직매장 건립현황 1부
 2. 고흥군 로컬푸드 직매장 출하농가 신청현황 1부
 3. 고흥군 로컬푸드 직매장 세부 설명회 자료 1부, 끝.




수선 수선자 참조
 (경유)
 제목: 고흥군 로컬푸드 직매장 운영 읍면별 이장단 및 출하농가 설명회 협조
 1. 우리군에서는 농가의 지속적인 영농활동과 지역에서 생산한 신선한 농수특산물을 공급 판매하고 군민의 건강찬 먹거리 소비처 제공을 위해 "고흥군 로컬푸드 직매장" 건립 추진중에 있습니다.
 2. 이에 2025년 11월중 준공 예정인 고흥군 로컬푸드 직매장 운영을 위하여 읍면별 이장단 및 출하농가 설명회를 진행코자 하오니 읍면사무소에서는 협조하여 주시기 바라며, 실단체소에서는 업무에 참고바랍니다.

1. 읍면별 이장단 설명회
 가. 일정: 2025. 8. 19. ~ 9. 26.
 나. 장소: 읍면사무소 회의실
 다. 참석: 8월~9월중 이장회의 - 이장 및 부녀회장
 라. 내용: 고흥군 로컬푸드직매장 건립현황, 출하농가 참여 안내
 마. 추진: 고흥군 농촌 신활력플러스사업단(운영 추진)

2. 출하농가 교육설명회
 가. 일정: 2025. 8. 28. ~ 9. 30.
 나. 장소: 읍면사무소 회의실
 다. 참석: 출하희망농가 및 대상농가, 가공품 제조 경영체
 라. 내용: 로컬푸드직매장 운영 교육 및 설명회
 마. 추진: 고흥군 농촌 신활력플러스사업단(운영 추진)



불임 1. 고흥군 로컬푸드직매장 건립 현황 1부
 2. 고흥군 로컬푸드직매장 읍면별 이장단 및 출하농가 설명회 일정 1부
 3. 고흥군 로컬푸드직매장 운영활성화 방안 1부, 끝.

주무관: 이명진, 소관부서: 농림축산, 담당: 농림정책과장, 기일: 2025. 11. 17, 문명환
 원조자: 사명: 농림정책과-3044, 우: 59042, 전라남도 고흥군 고흥문화회관 1, 전화번호: 061-630-6780, 팩스번호: 061-630-9887, 이메일: k2@hkg.go.kr, 홈페이지: www.hkg.go.kr, 첨부: 농림축산-정책과-고흥

□ 공사장 주변

- 2025. 11. 7. 현재 공사장 주변 안전관리 철저



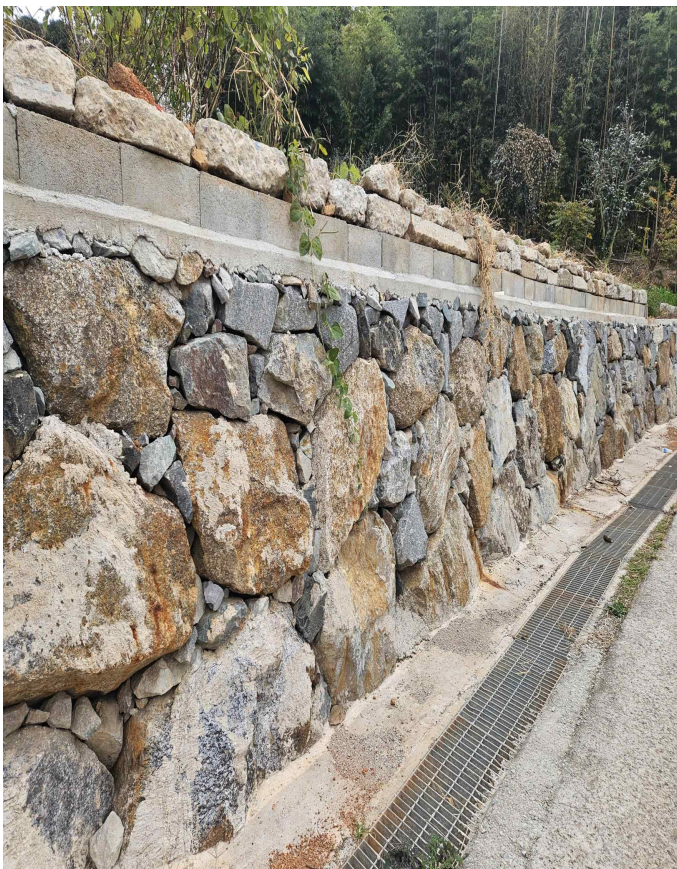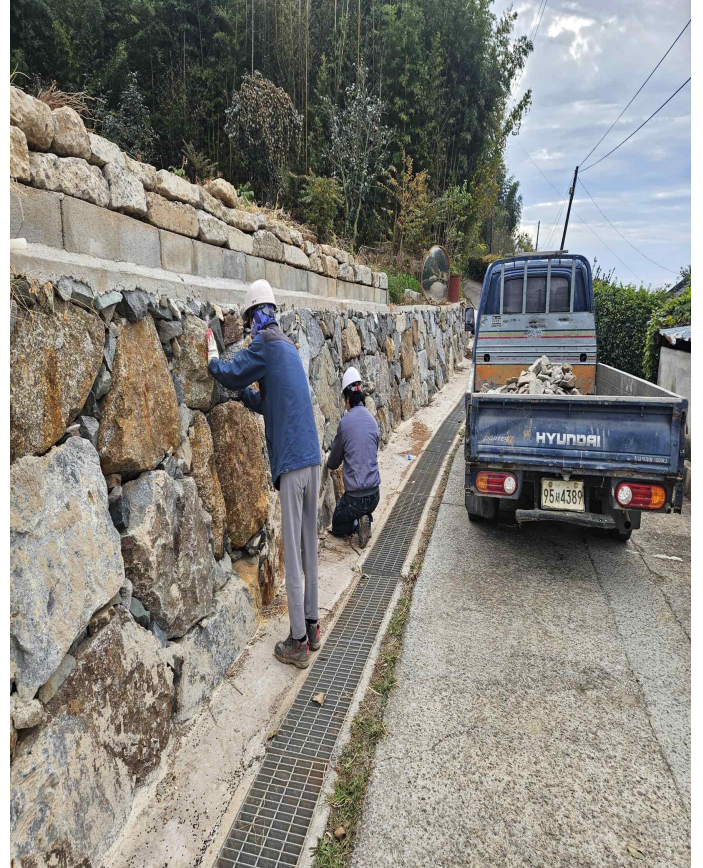







전



중



후

□현재 설치된 안내판 위치상 가시성·이용성에서 미흡하므로, 위치를 재검토해 재설치함으로써 이용자의 접근성과 편의성을 높이고 이용률 증진 위해 위치 변경

□위치 선정 기준

- 통행량이 많고 시야가 확보되는 위치
- 정보 전달력 : 안내판이 주변 배경에 묻히지 않도록 색채·크기·배치 고려
- 현장 조사 → 후보 위치 2~3개 고려 → 최종 위치 선정
- 설치 방식 : 기존 구조물 재설치

□기대 효과 및 이용률 증진을 위한 홍보방안

- 위치 재검토하여 변경하여 보다 많은 사람이 안내판을 인지하게 되어 지역 시설·서비스 이용 증가 예상
- 홍보 방향성 : “도덕 힐링 오솔길” 명칭을 포함하여 브랜드화 위해 숲길을 하나의 휴양 자원으로 브랜딩
- 핵심 메시지 : “함께 걷는 힐링의 길”, “주민·관광객 모두 쉬어가는 숲길”
- 홍보 채널 및 방법
 - 온 라 인 : SNS, 관광 정보 홈페이지, 유튜브 숏영상 또는 사진 콘텐츠
 - 오프라인 : 마을회관·상가·버스정류장 등지에 안내 포스터, 현수막 설치, 수국 및 맥문동 무단 채취 금지 안내 현수막 설치 등



현재 안내판 위치



변경 안내판 위치

군감사 지적사항 조치 계획

1. 일반사항

공 사 명 : 기존 농업인용 임대형스마트팜 건축기계공사

점 검 일 자 : 2025년 10월 21일

점 검 자 : 고흥군 군의회



발 주 자 : 한국농어촌공사

시 공 자 : 유에스아이건설(주)


2. 지적사항 및 조치결과

지적사항	조치결과	비고
이동통로 바닥 콘크리트 균열	1. 이동통로 바닥 콘크리트 균열 10개소 중 작물 운반이나 장비 통행에 지장이 없는 2개소 보수완료 2. 온실내부 통로 및 보수로인해 통행에 지장을 초래하는 부분은 작물재배기간 완료후 보수하기로 경작자와 협의 완료	첨부 #1
지붕 비닐 파손	1. 지붕 비닐 현재 파악된 1개소 보수 완료 2. 추후 발생 비닐파손 부분에 대하여는 경작자와 확인후 보수하기로 협의완료	첨부 #2
천창개폐기 불량	1. 천창 푸쉬바 탈락에 의한 개폐기 불량 조치 완료	첨부 #3
난방 튜브레일 선형조정 및 뜸현상	1. 튜브레일 선형조정 및 들뜸부위 보수 2. 추후 발생구간은 경작자와 확인후 보수예정	첨부 #4


#첨부 1 : 이동통로바닥 CON'C 균열조치

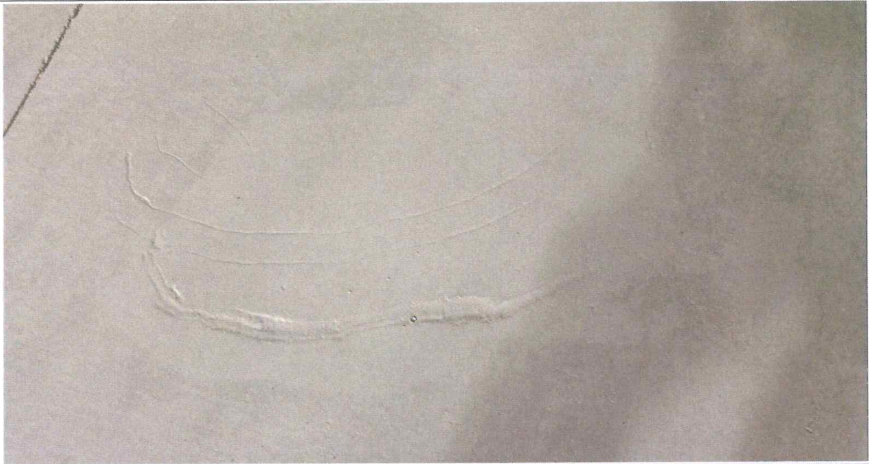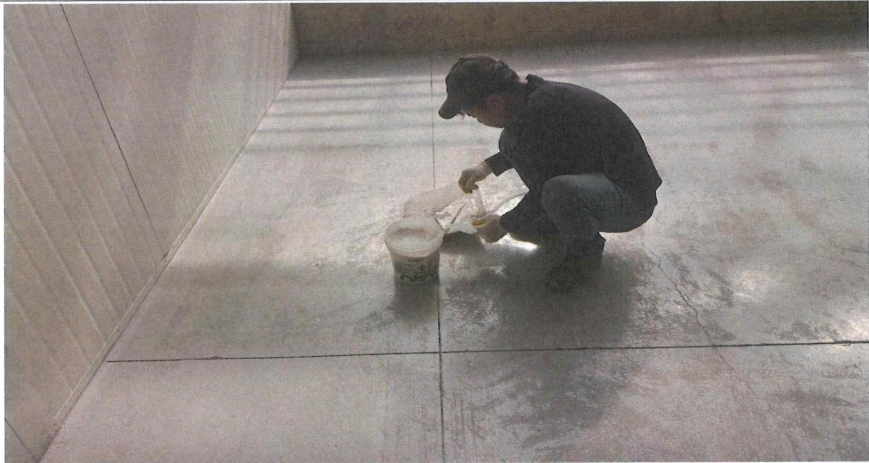구분	관련사진
조치전	
조치중	
조치후	

#첨부 2 : 지붕 비닐 파손부 조치

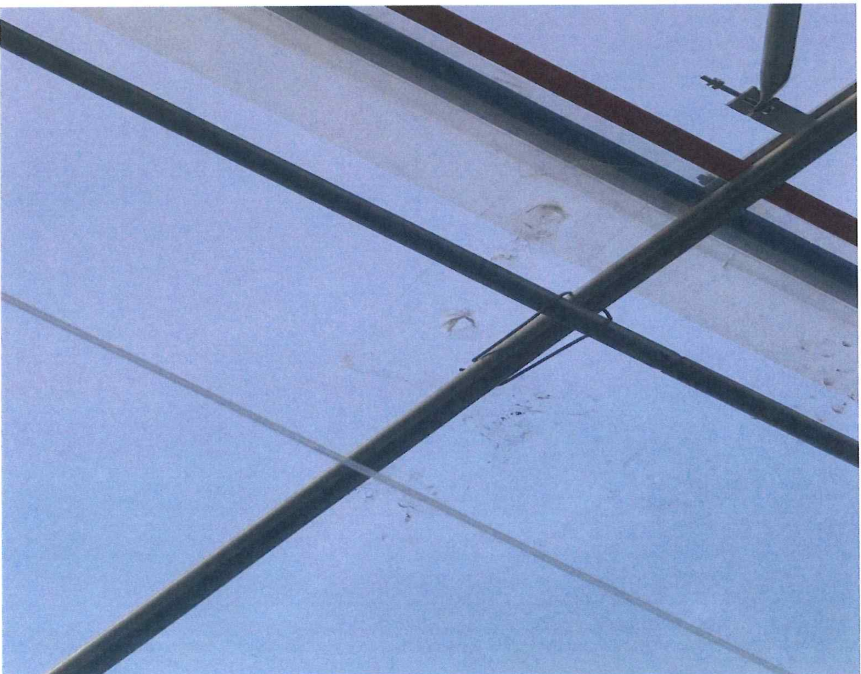구분	관련사진
조치중	
조치후	

#첨부 3 : 천창 개폐장치 조치(푸쉬바 탈락)

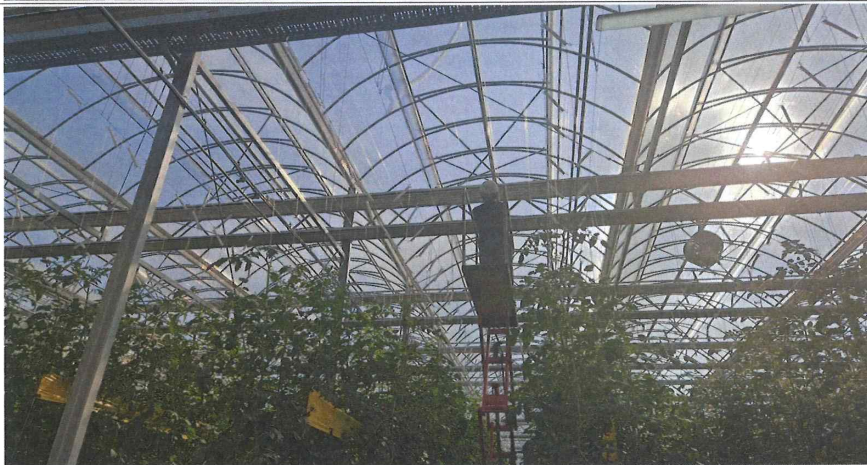구분	관련사진
조치전	
조치중	
조치후	

#첨부 4 : 튜브레일 구매 조정

구분	관련사진
조치전	
조치중	
조치후	

지방세외수입 납부확인서						
납부 번호	기관부서코드(11)	부과연도(4)	회계구분(2)	회계과목(6)	부과번호(6)	분납순번(2)
	48801780000	2025	41	235009	000001	00
전자납부번호		46770-2-25-41-1-0128370-4				
납부자명:		유한회사 장강		납부자 등록번호: 214714-0001622		
주소(영업소):		전라남도 고흥군 고흥읍 여산당촌길 23, 301호(고흥군산립조합청사)				
부과대상:		2024 스마트팜 혁신밸리 저수조 준설공사 사업비 반환금 청구				
회계과목명	본세	가산금	분납이자	부가가치세	납 부 일	
기타환수금	905,250 원	0 원	0 원	0 원	2025-11-07	
계	905,250 원	0 원	0 원	0 원		

위 금액의 납부를 확인합니다.

2025년 11월 11일



고흥군수

부과부서	스마트팜사업소	전화번호	061-830-5041
------	---------	------	--------------

해당 납부확인서는 영수증의 용도로 사용가능하며 법적효력이 없음



합 의 서 (준공정산)				
공 사 명	스마트팜 혁신밸리 저수조 준설공사			
당사는 귀 시와 계약 체결하고 수행한 "스마트팜 혁신밸리 저수조 준설공사"를 실시하였으나 현장상황과 계약내역이 불일치 하여 실준공분에 대하여 정산 합의하고 용역금액 감액하는 등 준공정산 내용에 하등의 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다.				
합 의 내 용				
				(단위:원)
구분	당초	변경	증, 감	비고
도금액	금45,250,000 (원)	금44,344,750 (원)	-W905,250	감액
사 유	본 공사 실 준공수량 반영			
	사토장 준설	417두베→0두베		감 417두베
	중기운반	1식→0식		감 0식



회사명 유 한 회 사 장 강
 주 소 전라남도 고흥군 고흥읍 여산당촌길 23, 301호
 대표자 손 명 회 (




고흥군 재무관 귀중



작업 전(배수로 에폭시 도장)

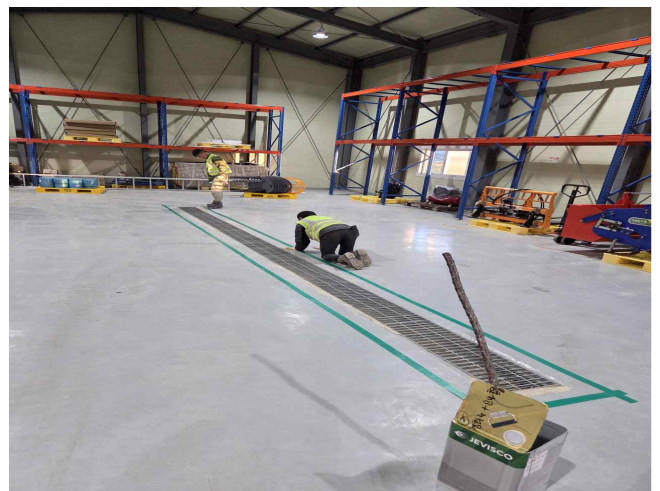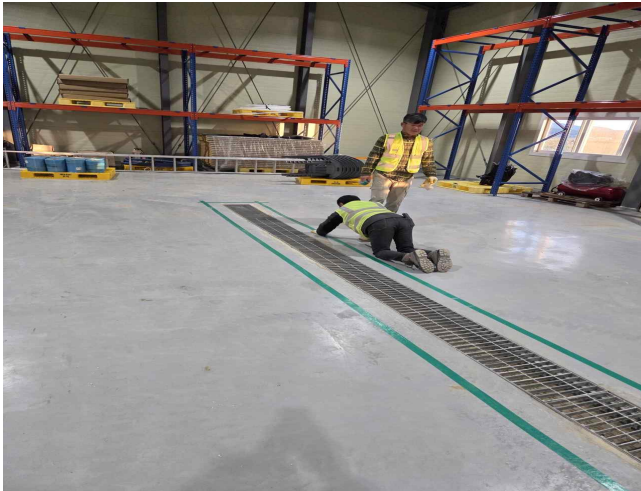

작업 중(배수로 에폭시 도장)

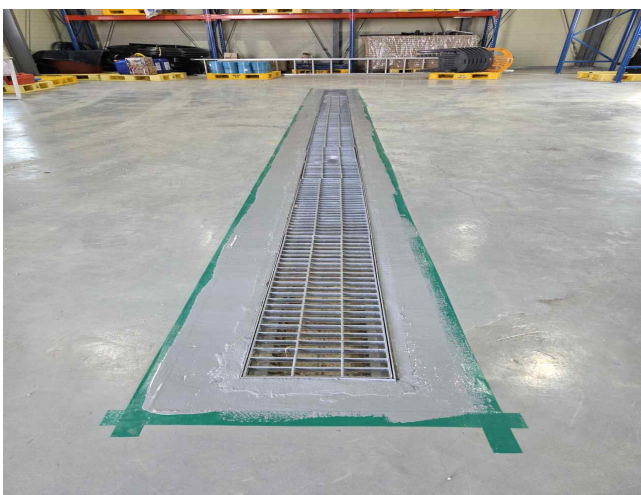


작업 후(배수로 에폭시 도장)



작업 전(바닥 에폭시 도장)



작업 중(바닥 에폭시 도장)

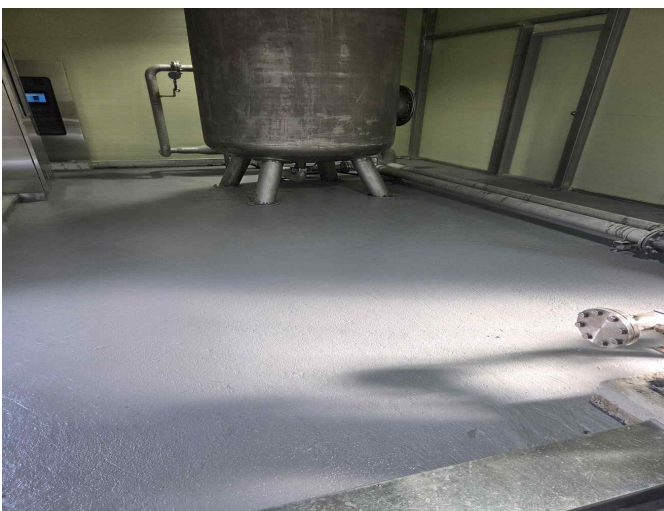

작업 후(바닥 에폭시 도장)

증빙자료

25. 풍양면사무소 청사 신축 조경공사 내역서

2. 식재공사		1 식		20,301,843		13,889,256		6,252,472		160,115	
소나무	H4.0XW2.0XR15	2 주	744,225	1,488,450	625,842	1,251,684	107,465	214,930	10,918	21,836	
소나무	H6.0XW3.0XR30	1 주	3,434,902	3,434,902	3,132,556	3,132,556	249,225	249,225	53,121	53,121	
전나무	H2.0XW1.0	13 주	94,265	1,225,445	68,436	889,668	23,447	304,811	2,382	30,966	
동백나무	H2.0XW1.0	9 주	201,711	1,815,399	175,882	1,582,938	23,447	211,023	2,382	21,438	
모과나무	H4.0XR15	3 주	649,725	1,949,175	531,342	1,594,026	107,465	322,395	10,918	32,754	
회양목	H0.3XW0.3	460 주	6,458	2,970,680	3,677	1,691,420	2,781	1,279,260			
영산홍	H0.3XW0.3	340 주	5,428	1,845,520	2,647	899,980	2,781	945,540			
개나리	H0.6X3지	110 주	3,883	427,130	1,102	121,220	2,781	305,910			
맥문동	8cm	1760 본	756	1,330,560	447	786,720	309	543,840			
비비추	8cm	750 본	962	721,500	653	489,750	309	231,750			
잔디	평떼	313.7 m²	9,860	3,093,082	4,620	1,449,294	5,240	1,643,788			
>소계				20,301,843		13,889,256		6,252,472		160,115	

공사 전



공사 중



공사 후

